

Toelichting PIV 2

1) Uitvoeringsplan:

* gelieve de vaste houders voor de opslag van diesel in te tekenen op het plan (cfr. scheidingsafstanden). * gelieve ook de rubrieknummer voor het wassen van voertuigen op het uitvoeringsplan te vermelden.

→ Aangepast uitvoeringsplan opgeladen (dieseltanks worden in andere loods voorzien, verdeelinstallaties worden voorzien op verharding is aangesloten op KWS-afscheider)

2) Effecten op geluid: * gelieve te verduidelijken of er gewerkt wordt van maandag TOT zaterdag of van maandag TOT EN MET zaterdag?

→ aangepast (tot en met zaterdag)

3) Effecten op biodiversiteit:

* Gelieve toe te lichten hoe de diverse toestellen voor het behandelen van afval (en de kranen en heftrucks) worden gevoed, zodat kan worden nagegaan of er stationaire bronnen aanwezig zijn of niet en zodat het correcte beoordelingskader kan worden nagegaan. Indien het stationaire bronnen betreft, is het beoordelingskader voor stationaire bronnen van toepassing en niet dat voor mobiliteit en dient de bijlage in die zin te worden aangepast.

→ 2 kranen en 2 wielladers op diesel mee opgenomen in impactscoreberekening exploitatiefase

4) Projectinformatie: *Graag hier aanduiden of u al dan niet wenst gehoord te worden in de zitting van de povc. *indien er reeds een werkplan voorhanden is, gelieve dit dan toe te voegen.

→ aangeduid


Toelichting PIV 3

1) Plannen/Bodem:


De vaste houders worden binnen geplaatst, maar de verdeelslang lijkt zich buiten in open lucht te bevinden (op basis van vermelding rubriek op het plan). Gelieve toe te

lichten waar er exact wordt getankt? Op basis van het rioleringsplan lijkt er ter hoogte van de verdeelslangen geen KWS-afscheider of afwatering van bedrijfsafvalwater aanwezig te zijn?

→ De verdeelinstallatie bevindt zich inderdaad buiten, onoverdekt. De verharding waarop de staat watert af naar de afvoergoten die aangesloten worden op een nieuwe KWS-afscheider. Deze oppervlakte van deze verharding zat reeds vervat in het berekende debiet van potentieel verontreinigd hemelwater.

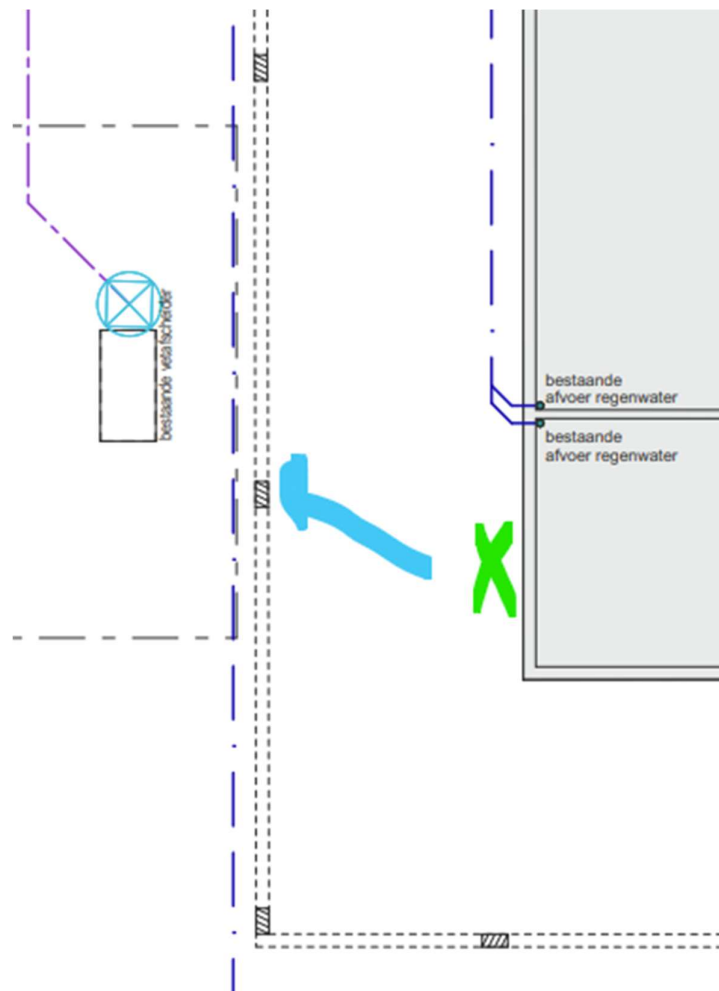

3.4.2 Lozen BA (paarse stippellijn)

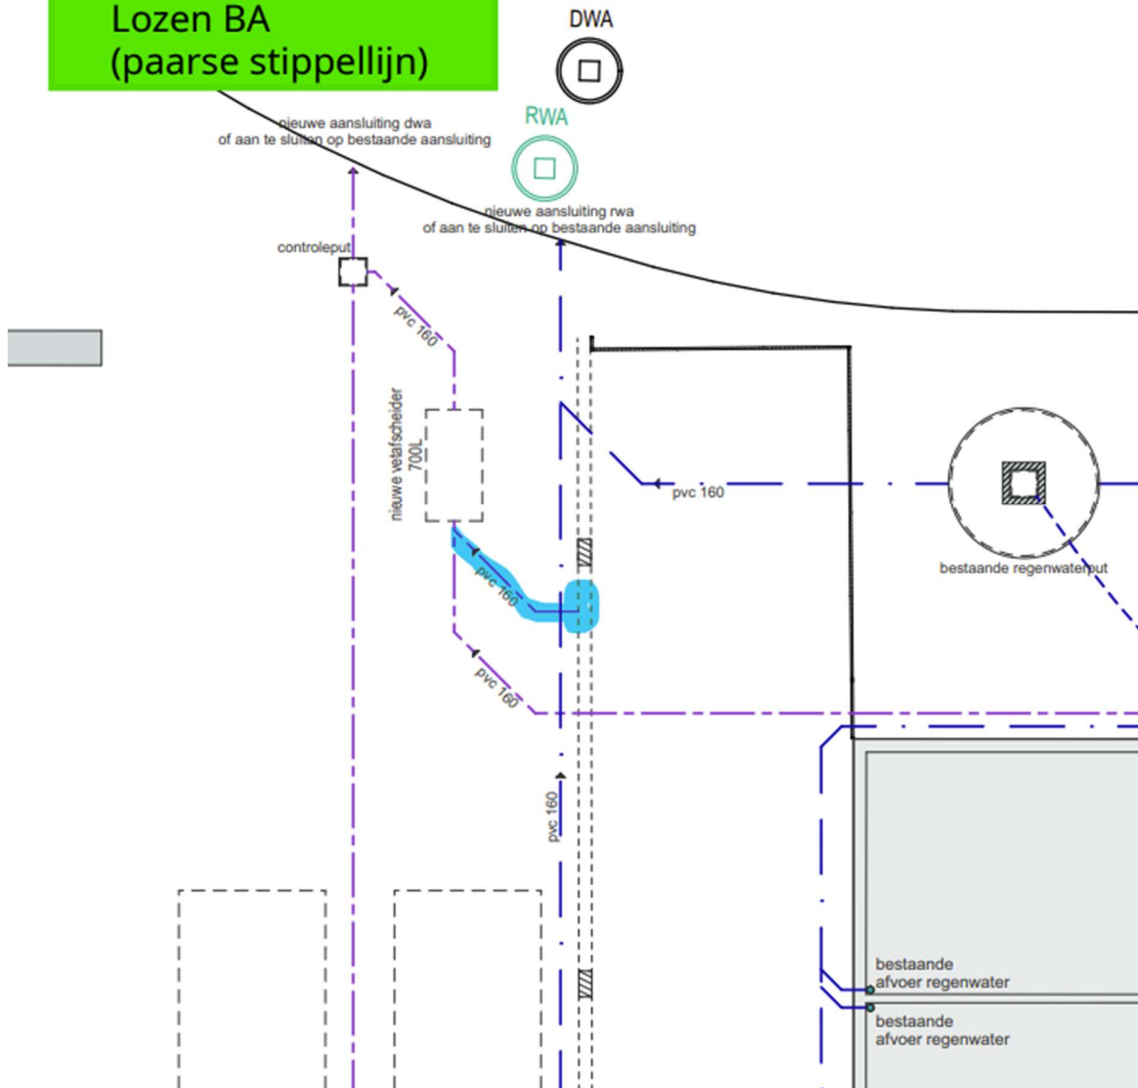

→ Bij het onderdeel bodem-effecten op de omgeving werd dit aangepast.

2) Op het rioleringsplan wordt een 'bestaande vetafscheider' vermeld aan de waszone. Betreft het een KWS-afscheider? Gelieve aan te passen of te bevestigen.

→ Zowel de nieuwe als de bestaande vetafscheider op het rioleringsplan betreffen KWS-afschers.
